


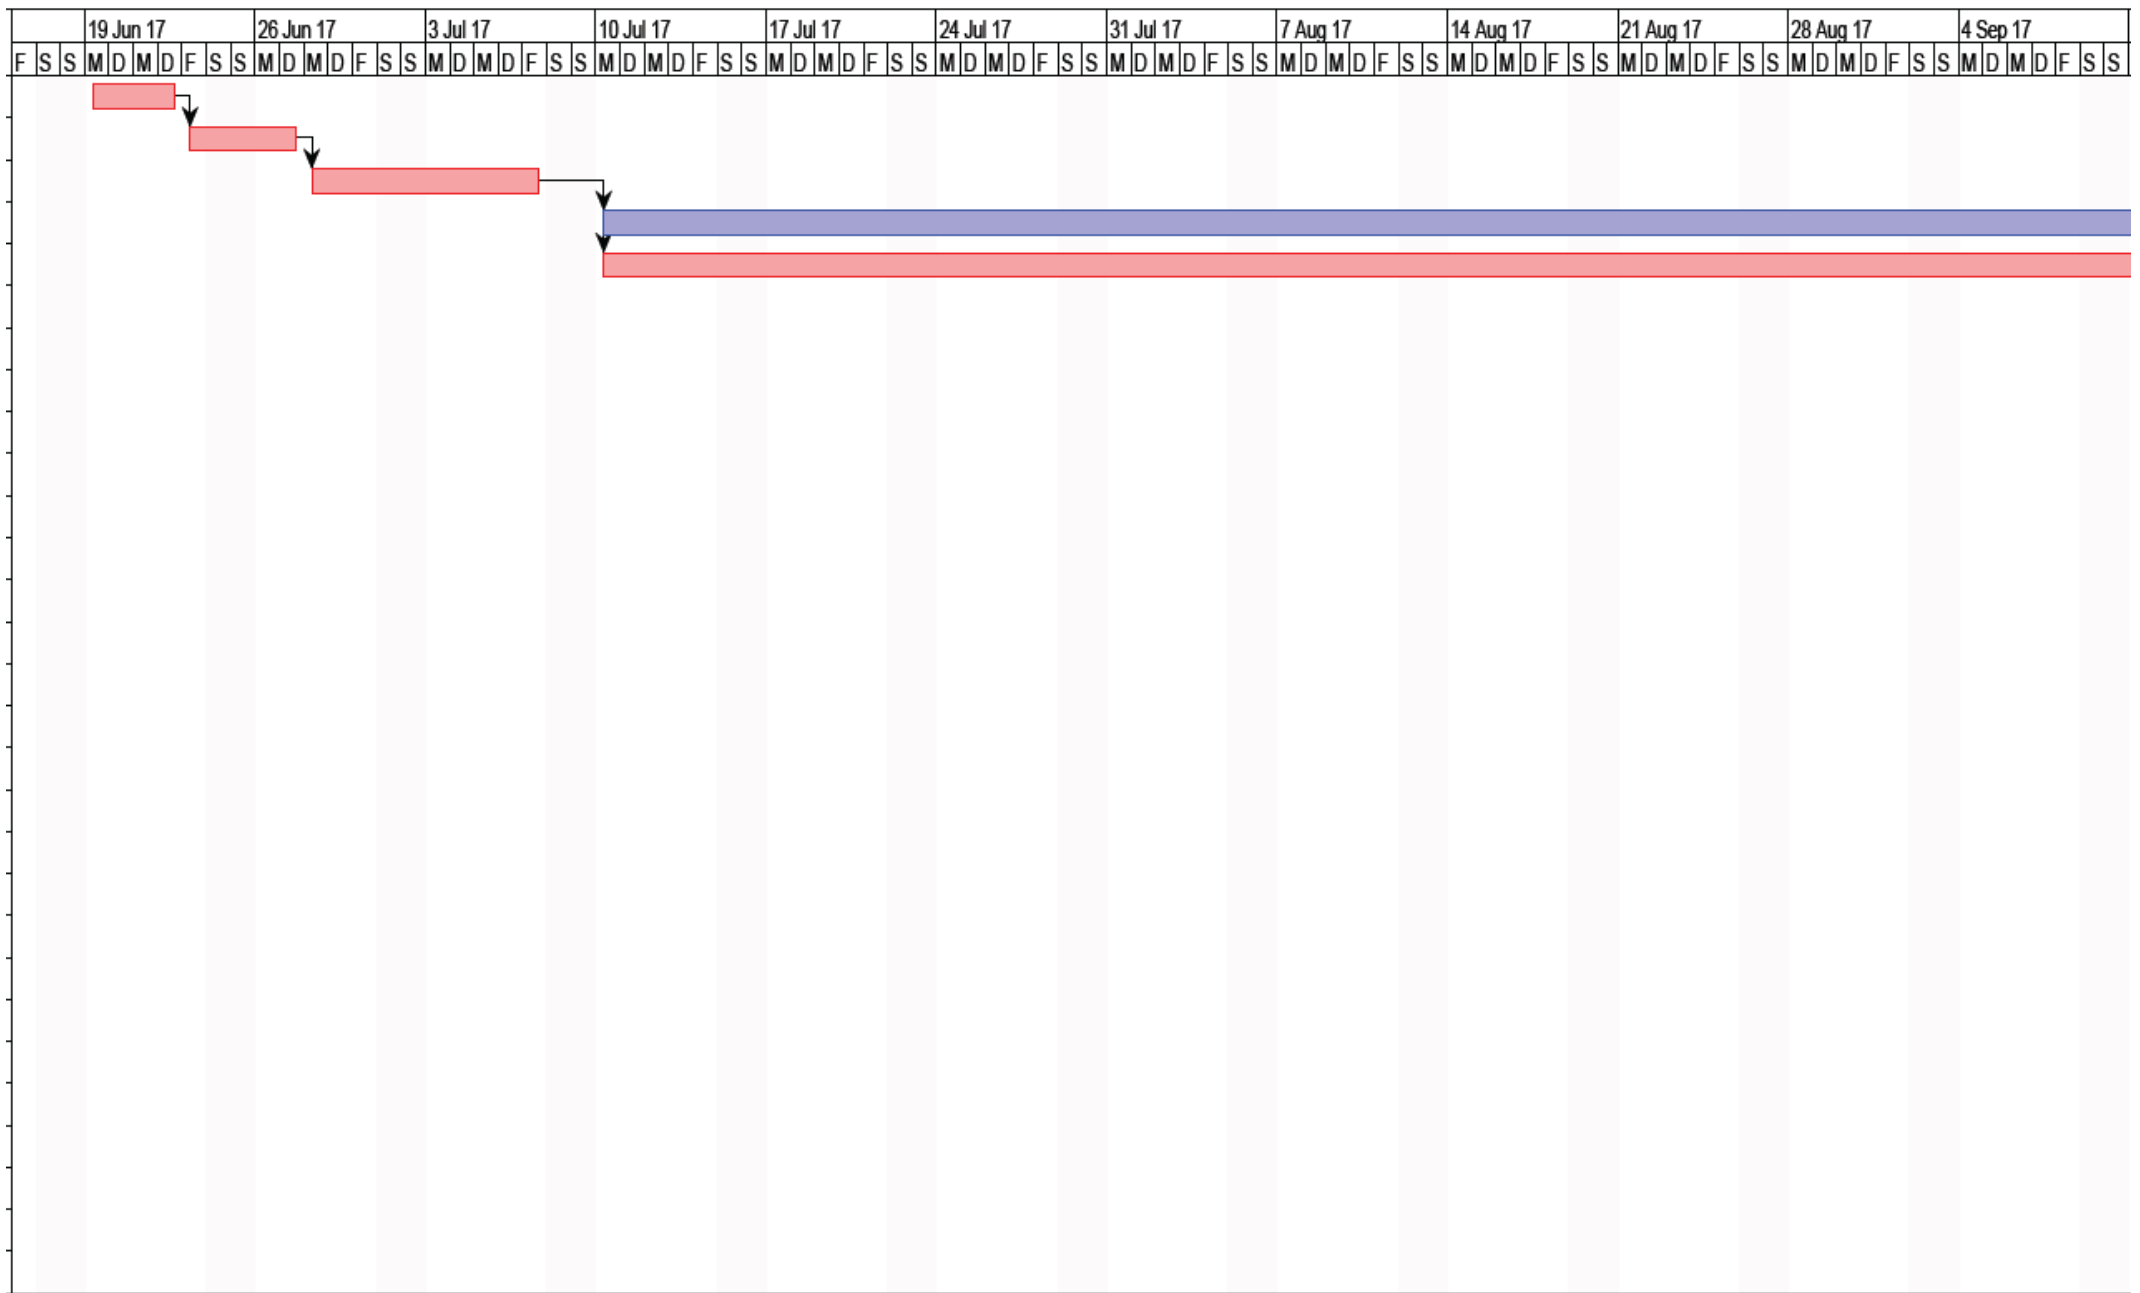
	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1		Entrümpeln/Räumen	4 tage	19.06.17 08:00	22.06.17 17:00		
2		Vorarbeiten, Elektro, Sanitär	3 tage	23.06.17 08:00	27.06.17 17:00	1	
3		Abbrucharbeiten	8 tage	28.06.17 08:00	07.07.17 17:00	2	
4		Erd-, Mauer-, Betonarbeiten	55 tage	10.07.17 08:00	22.09.17 17:00	3	
5		Aufmaß Bodenplatte, Vorfabrikation	55 tage	10.07.17 08:00	22.09.17 17:00	3	
6		Holzbau	5 tage	25.09.17 08:00	29.09.17 17:00	5	
7		Dachstuhl, Dachdeckung	10 tage	02.10.17 08:00	13.10.17 17:00	6	
8		Fensterbau	3 tage	16.10.17 08:00	18.10.17 17:00	7	
9		Fassadenbau	5 tage	19.10.17 08:00	25.10.17 17:00	8	
10		Fensterbänke	2 tage	19.10.17 08:00	20.10.17 17:00	8	
11		Heizung/Sanitär Grundinstallation	4 tage	19.10.17 08:00	24.10.17 17:00	8	
12		Eletro Grundinstallation	3 tage	19.10.17 08:00	23.10.17 17:00	8	
13		EMB Verbundstein und Isolierarbeiten	7 tage	26.10.17 08:00	03.11.17 17:00	9	
14		Trockenbau Vorrichten/Beplanken	3 tage	25.10.17 08:00	27.10.17 17:00	11	
15		Heizung/Sanitär weiterführende Installation	2 tage	30.10.17 08:00	31.10.17 17:00	14	
16		Elektro weiterführende Installation	2 tage	30.10.17 08:00	31.10.17 17:00	14	
17		Trockenbau Schliessen und Verspachteln	3 tage	01.11.17 08:00	03.11.17 17:00	15;16;26	
18		Estrichbau	5 tage	06.11.17 08:00	10.11.17 17:00	17	
19		Latenz Estrichtrocknung	10 tage	13.11.17 08:00	24.11.17 17:00	18	
20		Fliesenarbeiten	10 tage	27.11.17 08:00	08.12.17 17:00	19	
21		Heizung/Sanitär Endinstallation	10 tage	11.12.17 08:00	22.12.17 17:00	20	
22		Malerarbeiten	5 tage	11.12.17 08:00	15.12.17 17:00	20	
23		Elektro Endisnallation	5 tage	18.12.17 08:00	22.12.17 17:00	22	
24		Schreinerarbeiten	3 tage	18.12.17 08:00	20.12.17 17:00	22	
25		Verputzarbeiten	10 tage	06.11.17 08:00	17.11.17 17:00	13	
26		Innenfensterbänke	2 tage	19.10.17 08:00	20.10.17 17:00	8	



11 Sep 17	18 Sep 17	25 Sep 17	2 Okt 17	9 Okt 17	16 Okt 17	23 Okt 17	30 Okt 17	6 Nov 17	13 Nov 17	20 Nov 17	27 Nov 17	4 Dez 17	11 Dez 17	18 Dez 17
M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S

